

Informe ejecutivo N° 11, revisión 0

Edificio Torre 1, Lote 18

Agosto 2026

Cierre del período: 31-08-2026

Cliente

Proyecta Gestión

Constructora

CIH

Tipo de contrato

Administración

Código de proyecto

GIP_308

Superficie

41.597,97 m²


Plazo contractual

**01-04-2025 al
31-01-2028**



Dónde está la obra al cierre de agosto 2026

Con el 50,0% del plazo transcurrido, la obra lleva 40,7% ejecutado: +0,77 pp sobre el programa. El avance financiero (48,9%) supera en 8,19 pp al avance físico.

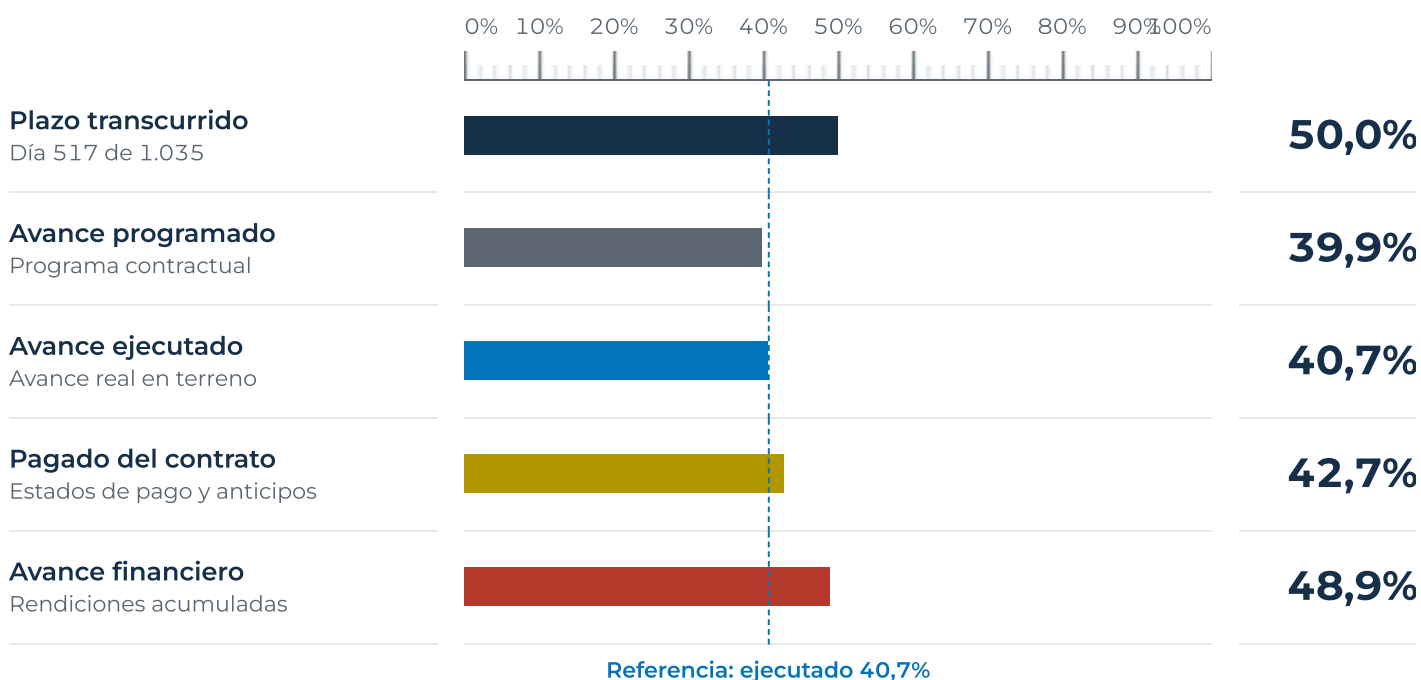

Semáforo de gestión

Verde
Avance físico vs programa
Ejecutado 40,7% vs programado 39,9% (+0,77 pp)
Rojo
Avance financiero vs físico
Gasto rendido 48,9% vs avance físico 40,7% (+8,19 pp)
Amarillo
Cierre de RDI
Tasa de cierre 76,9%, con 15 pendientes y 14 vencidas
Rojo
Seguridad (accidentabilidad vs industria)
Accidentabilidad 7,47% vs 2,72% de la industria (2,7 veces)
Amarillo
Conciliación de recursos obra vs EEPP
Máxima diferencia de 6,8% entre inventario en obra y lo pagado en EEPP

Antecedentes del contrato

Contrato por administración con CIH, por 1.032.334 UF IVA incluido y un plazo de 1.035 días. Restan 518 días para el término.

Constructora	CIH	Fecha de inicio	01-04-2025
Descripción de la obra	Edificio Torre 1, Lote 18	Fecha de término	31-01-2028
Tipo de contrato	Administración	Plazo de ejecución	1.035 días
Tipo de obra	Construcción	Días restantes	518 días
Código	GIP_308	Plazo transcurrido	50,0%
Superficie	41.597,97 m²	Monto del contrato (IVA incl.)	1.032.334 UF

Pólizas de seguro

Aseguradora	N° de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Chubb	6037094	Responsabilidad civil	226,10 UF	01-09-2025 al 29-05-2028
Southbridge	20119458	Todo riesgo de construcción	1.532,37 UF	14-08-2025 al 29-05-2028

Avance físico

Ejecutado 40,68% contra 39,91% programado al 31-08-2026: 5,5 días hábiles de adelanto. Para terminar en plazo debe avanzar 3,4% por mes; en el último mes avanzó 3,2%.

Verde: avance físico vs programa

Programado a la fecha 39,91% Línea base	Ejecutado a la fecha 40,68% Avance real en terreno	Desviación +0,77 pp 5,5 días hábiles de adelanto	Plazo transcurrido 50,0% Día 517 de 1.035
--	---	---	--


Ritmo para terminar en plazo

Avance necesario por mes 3,4% Promedio hasta el 31-01-2028	Avance del último mes 3,2% Últimas 4 semanas, llevado a 30 días
---	--

Para terminar el 31-01-2028, la obra debe avanzar en promedio 3,4% por mes, más que el 3,2% logrado en el último mes.


Seguimiento semanal de avance

Línea base acumulada Real acumulado Proyección acumulada Programado semanal Real semanal Proyección semanal

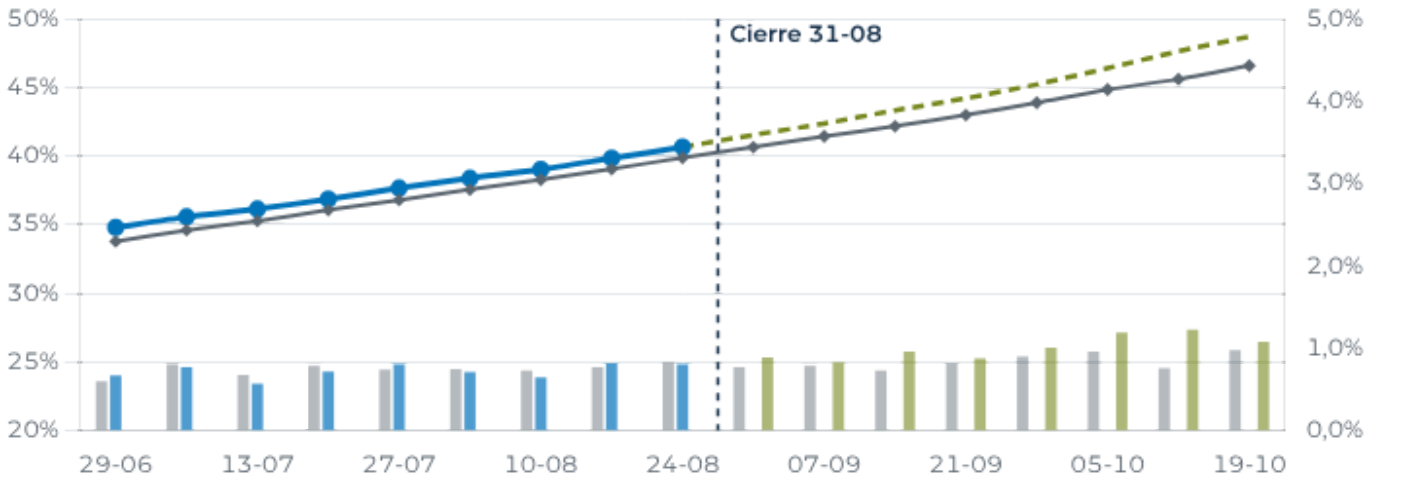


Este desfase de +0,77% respecto de la línea base representa un total aproximado de 5,5 días hábiles de adelanto acumulado. Las barras se leen en el eje derecho (avance semanal) y las líneas en el izquierdo (avance acumulado).

Hitos del programa

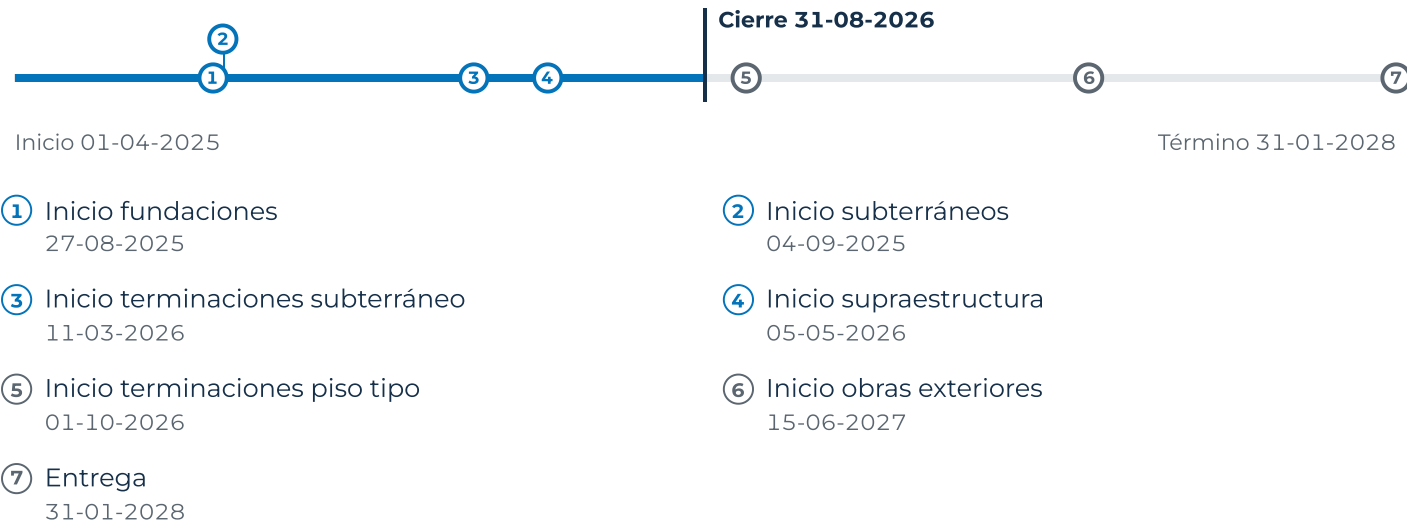

Fechas según línea base del programa. Los hitos en azul tienen fecha programada anterior al cierre del período.

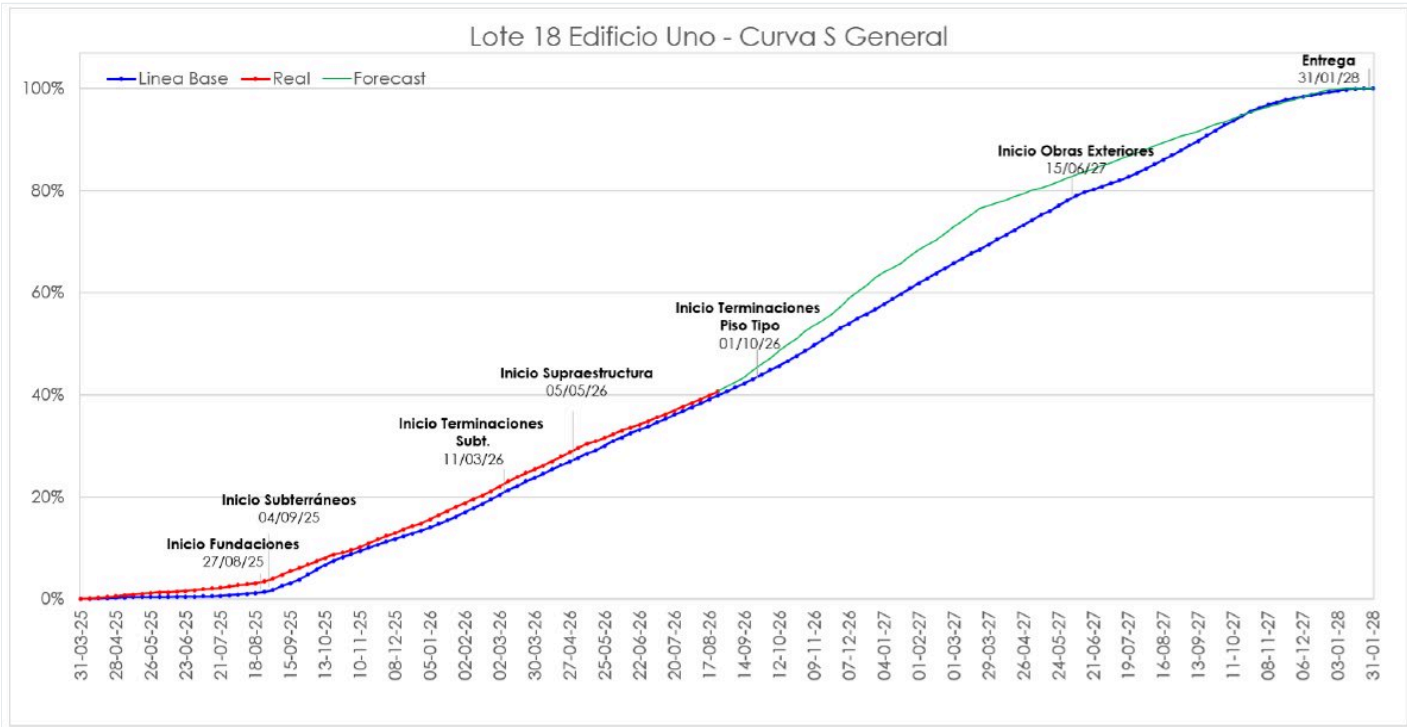

Curva S general del proyecto, con línea base, avance real y proyección hasta la entrega.

Producción semanal en m² (semanas 37 a 53)


Semana	Fecha	m² programado	Acumulado	m² instalados	Acumulado	Desv. parcial	Desv. acum.	Desfase (días)
37	04-05-2026	536	42.483	501	44.223	-34,9	+1.739	14
38	11-05-2026	536	43.020	700	44.922	+163,6	+1.903	13
39	18-05-2026	429	43.448	339	45.261	-89,9	+1.813	9

Semana	Fecha	m ² programado	Acumulado	m ² instalados	Acumulado	Desv. parcial	Desv. acum.	Desfase (días)
40	25-05-2026	953	44.402	496	45.757	-457,5	+1.355	8
41	01-06-2026	965	45.367	636	46.393	-328,6	+1.027	6
42	08-06-2026	738	46.105	845	47.238	+106,8	+1.133	6
43	15-06-2026	1.071	47.175	970	48.208	-100,7	+1.033	5
44	22-06-2026	1.061	48.237	532	48.740	-528,8	+504	3
45	29-06-2026	866	49.103	1.020	49.761	+154,0	+658	4
46	06-07-2026	951	50.054	660	50.421	-291,0	+367	3
47	13-07-2026	761	50.815	627	51.048	-134,5	+232	2
48	20-07-2026	847	51.663	693	51.741	-154,0	+78	1
49	27-07-2026	824	52.487	751	52.492	-73,5	+5	1
50	03-08-2026	846	53.333	1.309	53.801	+462,7	+468	3
51	10-08-2026	1.017	54.350	420	54.221	-597,2	-130	-1
52	17-08-2026	1.017	55.367	1.464	55.685	+446,9	+317	2
53	24-08-2026	930	56.298	1.108	56.793	+177,5	+495	3

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 42,7% del contrato (440.900 UF, incluidos 72.133 UF de anticipos). Quedan 591.435 UF por pagar.

● Rojo: avance financiero vs físico



Anticipos 72.133 UF 7,0% del contrato	Estados de pago 368.767 UF 35,7% del contrato	Saldo por pagar 591.435 UF 57,3% del contrato
--	--	--

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	1.032.334 UF	\$ 39.249.612.462	100,0%
Monto neto del contrato	867.508 UF	\$ 32.982.867.615	84,0%
Costo directo	695.920 UF	—	67,4%
Gastos generales y utilidades	171.588 UF	—	16,6%
Anticipos pagados a la fecha	72.133 UF	—	7,0%
Pagado en estados de pago y anticipos	440.900 UF	\$ 16.119.985.930	42,7%
Saldo por pagar (IVA incl.)	591.435 UF	\$ 16.862.881.685	57,3%
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	472.358 UF	\$ 19.182.783.257	45,8%

Avance físico frente al financiero


Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	39,9%	
Avance ejecutado a la fecha	40,7%	
Desviación física	+0,77 pp	Adelanto de 5,5 días hábiles
Avance financiero acumulado (rendiciones netas)	48,9%	Rendiciones netas sobre monto neto
Brecha avance financiero vs físico	+8,19 pp	Mayor gasto rendido que avance físico certificado
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	42,7%	
Plazo transcurrido	50,0%	Día 517 de 1.035

Estados de pago y rendiciones

En el período se cursó el EEPP 16 por 34.006 UF IVA incluido (factura N° 6910). Las rendiciones del mes suman \$ 1.595.976.853.

Estados de pago ordinarios 16 Último emitido: EEPP 16	Anticipos cursados 3 72.133 UF pagados	Estado de pago del período 34.006 UF EEPP 16, factura N° 6910	Rendiciones del período \$ 1.595.976.85 IVA incluido
--	---	--	---

Monto por estado de pago y pagado acumulado

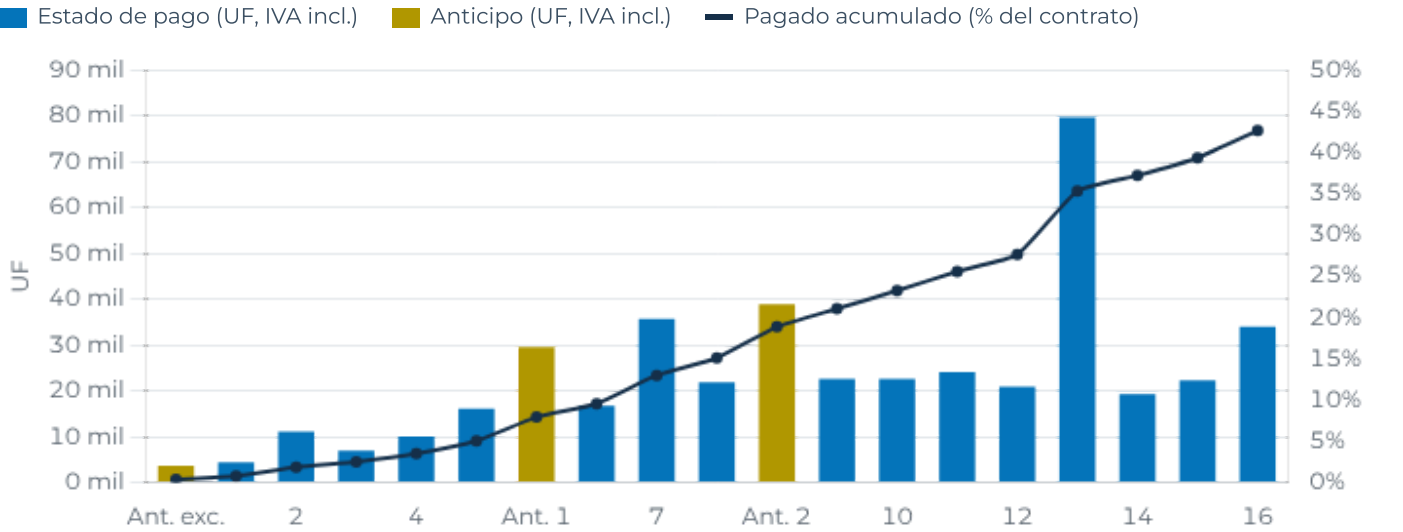

Concepto	UF	Detalle
Total neto facturado	370.504 UF	Estados de pago y anticipos
IVA facturado	70.396 UF	19% sobre el neto
Total pagado (IVA incl.)	440.900 UF	42,7% del contrato
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	\$ 19.182.783.257	48,9% de avance financiero acumulado

Detalle de los 19 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	Valor UF	IVA (UF)	Total (UF)	Acum. % contrato
Anticipo exc.	—	6653	3.099,48	39.042,94	588,90	3.688,38	0,4%
EEPP 1	—	6671	3.685,43	39.075,41	700,23	4.385,66	0,8%
EEPP 2	—	6680	9.335,99	39.189,45	1.773,84	11.109,83	1,9%
EEPP 3	—	6686	5.887,90	39.267,07	1.118,70	7.006,60	2,5%
EEPP 4	—	6705	8.448,72	39.179,01	1.605,26	10.053,98	3,5%
EEPP 5	09-09-2025	6723	13.534,86	39.383,07	2.571,62	16.106,48	5,1%
Anticipo 1	14-10-2025	6721	24.819,14	39.485,65	4.715,64	29.534,78	7,9%
EEPP 6	—	6744	14.056,42	39.485,65	2.670,72	16.727,14	9,6%
EEPP 7	17-11-2025	6756	30.004,17	39.567,67	5.700,79	35.704,96	13,0%
EEPP 8	24-12-2025	6775	18.379,47	39.643,59	3.492,10	21.871,57	15,1%
Anticipo 2	21-01-2026	6764	32.697,05	39.727,96	6.212,44	38.909,49	18,9%
EEPP 9	—	6791	19.040,60	39.727,96	3.617,71	22.658,31	21,1%
EEPP 10	31-01-2026	6810	19.032,76	39.706,07	3.616,22	22.648,98	23,3%

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	Valor UF	IVA (UF)	Total (UF)	Acum. % contrato
EEPP 11	28-02-2026	6824	20.263,16	39.790,63	3.850,00	24.113,16	25,6%
EEPP 12	30-03-2026	6840	17.592,95	39.841,72	3.342,66	20.935,61	27,7%
EEPP 13	30-04-2026	6857	67.016,30	40.120,20	12.733,10	79.749,40	35,4%
EEPP 14	31-05-2026	6875	16.262,49	40.610,68	3.089,87	19.352,36	37,3%
EEPP 15	30-06-2026	6893	18.770,61	40.820,31	3.566,42	22.337,03	39,4%
EEPP 16	31-07-2026	6910	28.576,51	40.844,79	5.429,54	34.006,05	42,7%
Total			370.504,01	70.395,76	440.899,77	42,7%	

Estructura de costos rendidos

El gasto rendido acumulado equivale al 41,60% del monto del contrato. Los subcontratos concentran el 39,81% del gasto.

Ítem de costo	Participación en el gasto rendido	% del gasto	% s/ contrato
Subcontratos		39,81%	16,56%
Facturas		21,44%	8,92%
Mano de obra		16,29%	6,78%
Honorarios C.I.H.L.A.		16,19%	6,73%
Arriendos y fletes		4,22%	1,76%
Gastos generales obra		2,01%	0,84%
I.E.C.		0,04%	0,01%
Total gasto rendido		100,00%	41,60%

Requerimientos de información (RDI)

De 65 RDI emitidas, 50 están resueltas (76,9%). Quedan 15 pendientes, 14 de ellas vencidas. Estado al 14-09-2026.

RDI emitidas

65

Estado al 14-09-2026

Resueltas

50

Tasa de cierre 76,9%

Pendientes

15

23,1% del total

Abiertas vencidas

14

De 15 abiertas

Respuesta promedio

22,3 días

Entre consulta y
respuesta

Distribución por especialidad

Arquitectura		31 47,7%
Cálculo		15 23,1%
Eléctrica		10 15,4%
Proyecto		3 4,6%
BMS		2 3,1%
Seguridad		2 3,1%
Climatización		1 1,5%
Riego		1 1,5%
Sanitaria		0 0,0%

Plazo de respuesta de las RDI resueltas

En plazo		20
Por vencer		11
Fuera de plazo		19

Clasificación de las 50 RDI resueltas según su plazo de respuesta.

Calidad de obra

Se recibió la estructura hasta losa de cielo piso 6. Hubo una observación crítica en enfierradura, corregida sin impacto en plazo.

Revisiones del período

- Se reciben en conjunto al ITE trabajos de enfierradura y hormigonado de estructuras hasta losa de cielo piso 6, incluyendo pasadas en losas y muros para instalaciones.
- Se verifican en terreno instalaciones en losa y muro de obra gruesa.
- Se revisa correcta ejecución de tabiquería en bodegas y hall de ascensores.

Observaciones

Observación crítica del período

Se detecta falla en instalación de enfierradura, donde los empalmes de fierro no quedaban amarrados, perdiendo el contacto y en consecuencia el empalme.

Solución

Se juntan y amarran los elementos mal instalados para cumplir los requerimientos de estructura.

Impacto

La observación no tiene impacto en plazo, ya que fue detectada a tiempo.



Pruebas de presión

Se reciben pruebas de presión en alimentación de agua en jardineras de pisos tipo.



Seguridad e higiene

La accidentabilidad de la obra (7,47%) es 2,7 veces la de la industria (2,72%). Van 33 días sin accidentes al 28-08-2026.

● Rojo: seguridad (accidentabilidad vs industria)


Accidentes acumulados	Días perdidos acumulados	Último accidente	Días sin accidentes
8	153	14-07-2026 8 días perdidos	33 Al 28-08-2026

Comparación con la industria

Indicador	Torre 1	Industria 2025	Brecha
Tasa de accidentabilidad (jun-26)	7,47%	2,72%	+4,75 pp
Días perdidos por accidente	19,1	24,6	-5,45 días
Tasa de siniestralidad (abr-25 a jun-26)	154,8	No informado	—

Fuente de industria: Industria construcción 2025, base estadística sobre seguridad social 2025. Siniestralidad = días perdidos del período / promedio anual de trabajadores × 100. Accidentabilidad = N° de accidentes del período / promedio anual de trabajadores × 100.

Cumplimiento D.S. N° 594 (servicios higiénicos)



Dotación de referencia: 301 a 310 personas por turno. Todos los servicios superan el mínimo exigido.

Recursos en obra frente a estados de pago

El inventario en obra es menor que lo pagado en EEPP en los tres recursos controlados. La mayor diferencia es 6,8%, en moldaje de losa.

● Amarillo: conciliación de recursos obra vs EEPP

Recurso	En obra	En EEPP	Diferencia	%
Alzaprimas (un)	4.457	4.616	-159	-3,4%
Moldaje losa (m²)	2.329	2.500	-171	-6,8%
Moldaje muros (m²)	346,9	360	-13,1	-3,6%



Alzaprimas. Piso 1 cuenta con 50% de alzaprimas, piso 2 con 50% del área alzaprimada, piso 3 con 100% y piso 4 con 100% (moldaje cielo piso 5). Se programa el retiro de alzaprimas del paso de camiones para la primera semana de septiembre.



Moldajes. Avance en losa cielo piso 5 con moldaje. Descimbre de cielo piso 3 y 4.

Hitos y hechos relevantes del período

Hitos contractuales

- Avance de obra en losa cielo piso 6.
- La constructora entrega a la inmobiliaria el presupuesto de obra por partidas para seguimiento mensual. Se define una reunión mensual para verificar avances, y la ITO debe validar los avances en terreno.
- Instalación de faenas terminada y entregada al comité paritario de obra. Se instala todo el equipo profesional de Torre 1.

Hechos relevantes

- Con fecha 31-08-2026 se cierra el período con un avance real de 40,68% contra 39,91% programado, con un adelanto de 5,5 días.
- Se define con la inmobiliaria el alcance de tabiquería y la cantidad de baños en piso -1, según lo indicado en reunión de obra.
- Comienza la instalación de moldaje de losa con mesas prefabricadas PERI. Se estima que desde el piso 5 en adelante mejore el rendimiento de instalación de moldaje.
- Planos Tecma entregados con observaciones en piso -1, locales 9 y 10. Se debe considerar cierre de cortina metálica con puerta en local 9.
- Se define en reunión con la constructora que, por el momento, solo se dará orden de compra a los aluminios de cierres vidriados de locales.
- Se fija para septiembre la fecha del mockup de jardineras, para revisar solución técnica y estándar.

Registro fotográfico

22 fotografías del período, ordenadas desde el nivel más bajo hacia la cubierta. Seleccione una para ampliarla.



Subterráneo -8
Trabajo ascensor parking



Piso -8
Instalaciones sanitarias



Piso -7
Ascensor parking



Piso -6
Ascensor parking y tabiquería



Piso -5
Tabiquería bodegas



Piso -4
Hall escaleras



Piso -3
Instalación de faenas



Piso -2
Instalaciones escotillas estanques



Piso -1
Hall ascensores



Piso -1
Locales comerciales



Piso 1
Hall principal



Piso 1
Vista exterior



Exterior
Vista norte



Exterior
Vista poniente



Exterior
Vista poniente 2



Exterior
Vista sur



Piso 2
Planta libre



Piso 3
Jardineras




Piso 4
Avance de escaleras prefabricadas



Piso 5
Mesas de moldaje PERI



Piso 6
Avance obra gruesa

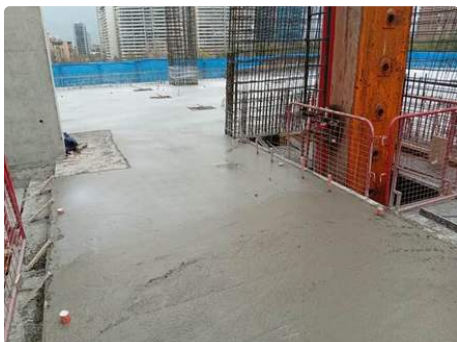


Piso 6
Avance obra gruesa

Accesos y gestión de camiones

La obra opera con 3 frentes de acceso controlados. Sin reclamos de vecinos

durante el período.

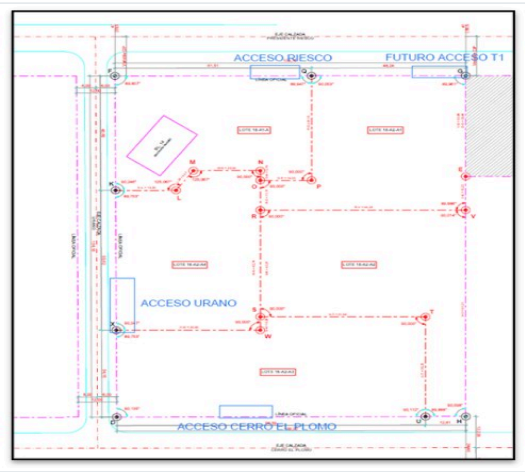


Plano de accesos habilitados.

Acceso	Vehículos	Personal	Control
Pdte. Riesco	Camión tolva y hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	2 accesos. Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería fija y jornal de lavado de ruedas.
Urano	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.
Cerro El Plomo	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.

Fotografías de accesos



Pdte. Riesco
Acceso 1

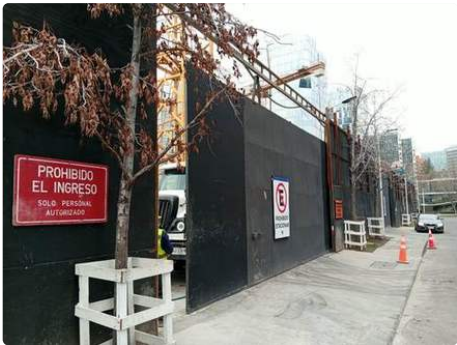

Urano
Acceso



Cerro El Plomo
Acceso



Pdte. Riesco
Acceso 2



Urano
Acceso



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago

contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 11, revisión 0

Edificio Torre 1, Lote 18 (GIP_308)

Período agosto 2026, cierre 31-08-2026
