

Informe ejecutivo N° 12, revisión 0

Edificio Torre 1, Lote 18

Septiembre 2026

Cierre del período: 30-09-2026

Cliente

Proyecta Gestión

Constructora

CIH

Tipo de contrato

Administración

Código de proyecto

GIP_308

Superficie

41.597,97 m²


Plazo contractual

**01-04-2025 al
31-01-2028**



Dónde está la obra al cierre de septiembre 2026

Con el 52,8% del plazo transcurrido, la obra lleva 44,2% ejecutado: +1,20 pp sobre el programa. El avance financiero (48,9%) supera en 4,65 pp al avance físico.

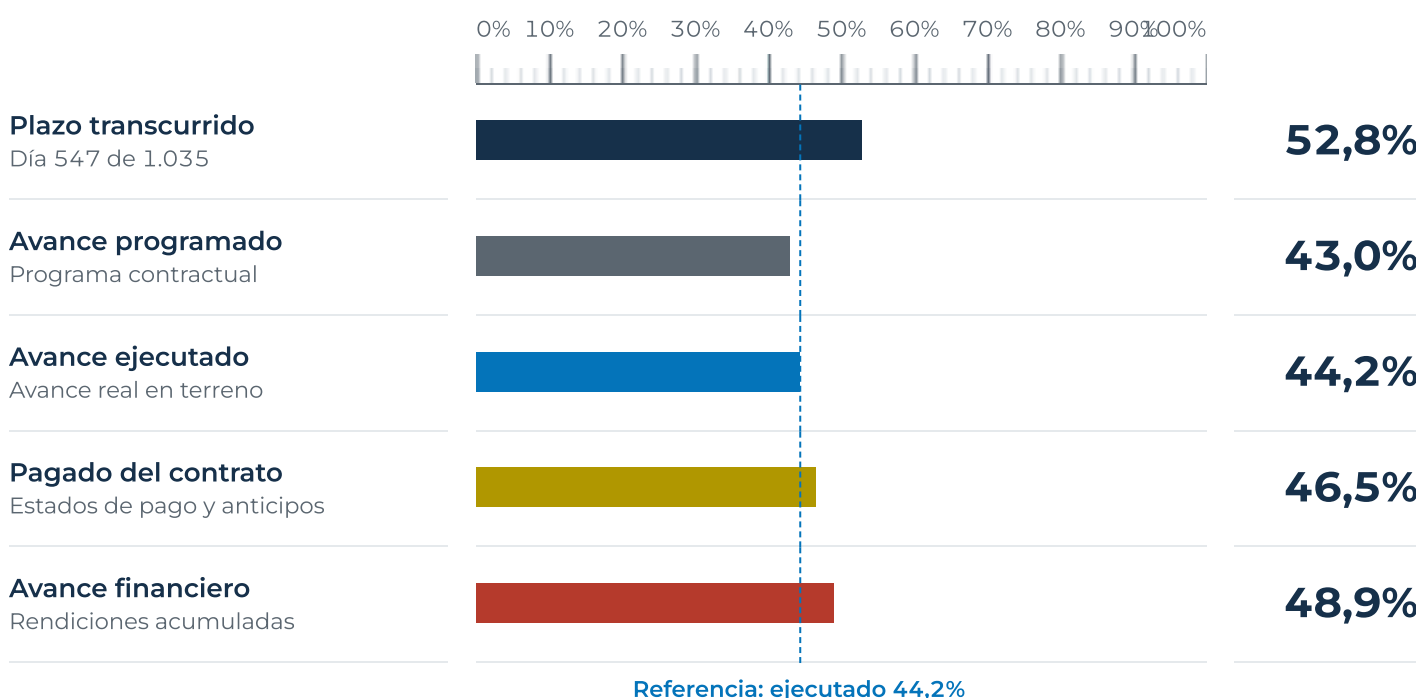

Semáforo de gestión

Verde
Avance físico vs programa
Ejecutado 44,2% vs programado 43,0% (+1,20 pp)
Amarillo
Avance financiero vs físico
Gasto rendido 48,9% a la rendición N° 17 vs avance físico 44,2% (+4,65 pp)
Amarillo
Cierre de RDI
Tasa de cierre 84,1%, con 11 pendientes y 11 vencidas
Rojo
Seguridad (accidentabilidad vs industria)
Accidentabilidad 8,17% vs 2,72% de la industria (3,0 veces)
Amarillo
Conciliación de recursos obra vs EEPP
Máxima diferencia de 6,8% entre inventario en obra y lo pagado en EEPP

Antecedentes del contrato

Contrato por administración con CIH, por 1.032.334 UF IVA incluido y un plazo de 1.035 días. Restan 488 días para el término.

Constructora	CIH	Fecha de inicio	01-04-2025
Descripción de la obra	Edificio Torre 1, Lote 18	Fecha de término	31-01-2028
Tipo de contrato	Administración	Plazo de ejecución	1.035 días
Tipo de obra	Construcción	Días restantes	488 días
Código	GIP_308	Plazo transcurrido	52,8%
Superficie	41.597,97 m²	Monto del contrato (IVA incl.)	1.032.334 UF

Pólizas de seguro

Aseguradora	Nº de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Chubb	6037094	Responsabilidad civil	226,10 UF	01-09-2025 al 29-05-2028
Southbridge	20119458	Todo riesgo de construcción	1.532,37 UF	14-08-2025 al 29-05-2028

La vigencia incluye el período de mantenimiento.

Avance físico

Ejecutado 44,22% contra 43,02% programado al 30-09-2026: 5,5 días hábiles de adelanto. Para terminar en plazo se necesitan 3,5 puntos de avance por mes; en el último mes se avanzaron 3,5.


Verde: avance físico vs programa

Programado a la fecha 43,02% Línea base	Ejecutado a la fecha 44,22% Avance real en terreno	Desviación +1,20 pp 5,5 días hábiles de adelanto
--	---	---

Avance mensual


Avance necesario para terminar en plazo 3,5 puntos Por mes hasta el término (31-01-2028); faltan 55,78%	Avance del último mes 3,5 puntos De 40,68% a 44,22% en septiembre 2026
--	---

Seguimiento semanal de avance

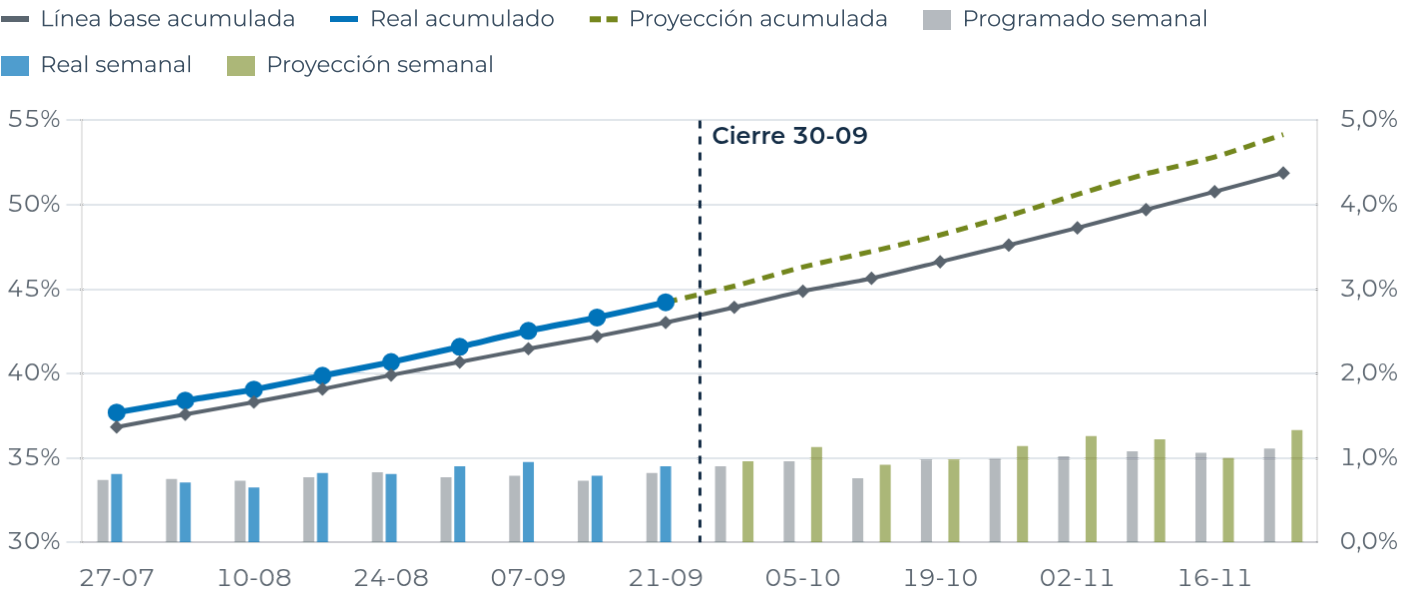


Este desfase de +1,20% respecto de la línea base representa un total aproximado de 5,5 días hábiles de adelanto acumulado. Las barras se leen en el eje derecho (avance semanal) y las líneas en el izquierdo (avance acumulado).

Hitos del programa

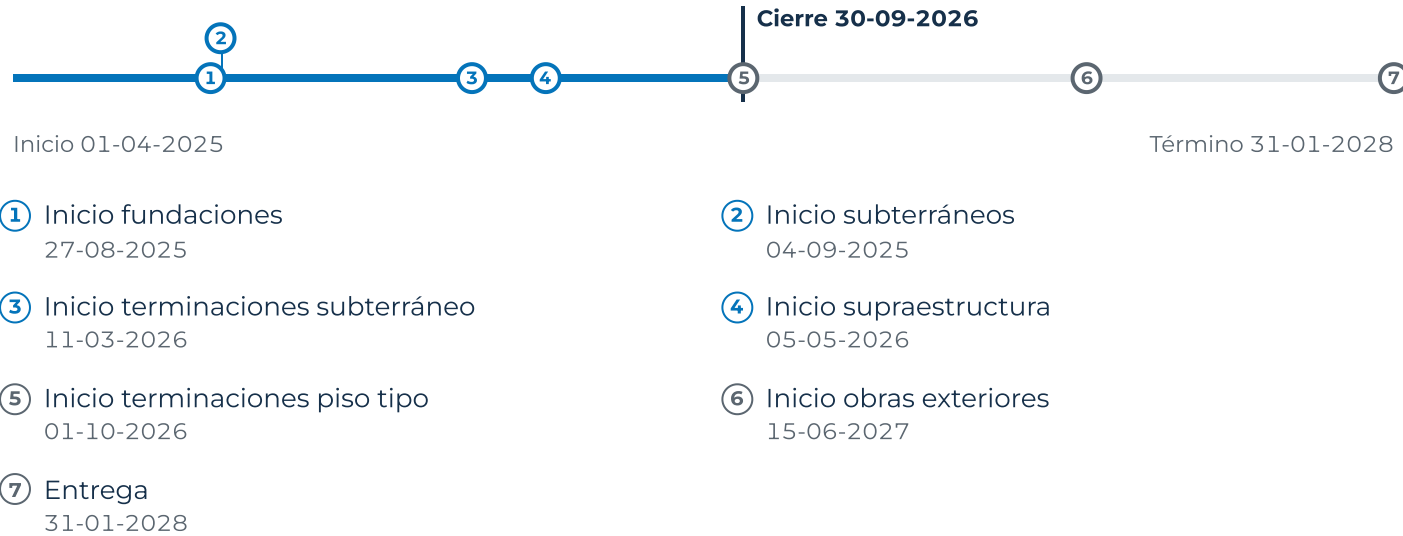

Fechas según línea base del programa. Los hitos en azul tienen fecha programada anterior al cierre del período.

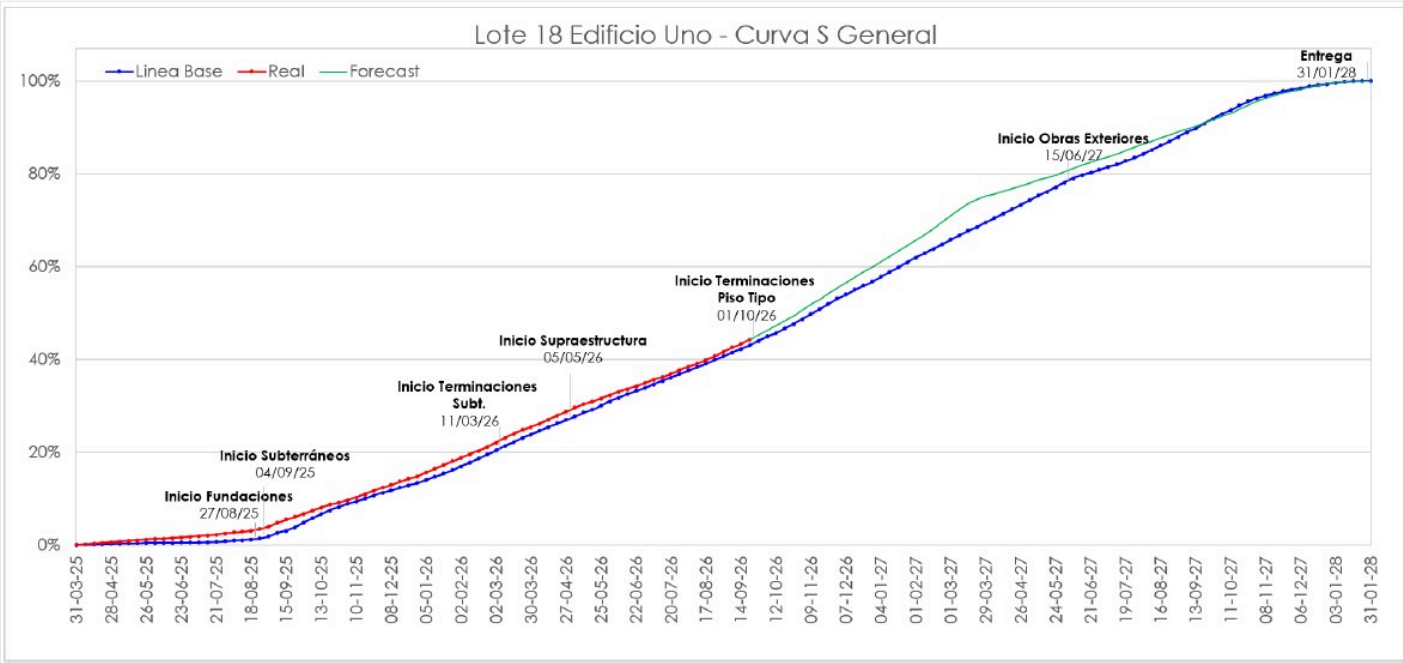

Curva S general del proyecto, con línea base, avance real y proyección hasta la entrega.

Producción semanal en m² (semanas 37 a 53)

Semana	Fecha	m² programado	Acumulado	m² instalados	Acumulado	Desv. parcial	Desv. acum.	Desfase (días)
37	04-05-2026	536	42.483	501	44.223	-34,9	+1.739	14

Semana	Fecha	m ² programado	Acumulado	m ² instalados	Acumulado	Desv. parcial	Desv. acum.	Desfase (días)
38	11-05-2026	536	43.020	700	44.922	+163,6	+1.903	13
39	18-05-2026	429	43.448	339	45.261	-89,9	+1.813	9
40	25-05-2026	953	44.402	496	45.757	-457,5	+1.355	8
41	01-06-2026	965	45.367	636	46.393	-328,6	+1.027	6
42	08-06-2026	738	46.105	845	47.238	+106,8	+1.133	6
43	15-06-2026	1.071	47.175	970	48.208	-100,7	+1.033	5
44	22-06-2026	1.061	48.237	532	48.740	-528,8	+504	3
45	29-06-2026	866	49.103	1.020	49.761	+154,0	+658	4
46	06-07-2026	951	50.054	660	50.421	-291,0	+367	3
47	13-07-2026	761	50.815	627	51.048	-134,5	+232	2
48	20-07-2026	847	51.663	693	51.741	-154,0	+78	1
49	27-07-2026	824	52.487	751	52.492	-73,5	+5	1
50	03-08-2026	846	53.333	1.309	53.801	+462,7	+468	3
51	10-08-2026	1.017	54.350	420	54.221	-597,2	-130	-1
52	17-08-2026	1.017	55.367	1.464	55.685	+446,9	+317	2
53	24-08-2026	930	56.298	1.108	56.793	+177,5	+495	3

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 46,5% del contrato (479.946 UF, incluidos 72.133 UF de anticipos). Quedan 552.388 UF por pagar.

● Amarillo: avance financiero vs físico

7,0%	39,5%	53,5%
Anticipos	Estados de pago	Saldo por pagar
72.133 UF	407.814 UF	552.388 UF
7,0% del contrato	39,5% del contrato	53,5% del contrato

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	1.032.334 UF	\$ 39.249.612.462	100,0%
Monto neto del contrato	867.508 UF	\$ 32.982.867.615	84,0%
Costo directo	695.920 UF	—	67,4%
Gastos generales y utilidades	171.588 UF	—	16,6%
Anticipos pagados a la fecha	72.133 UF	—	7,0%
Pagado en estados de pago y anticipos	479.946 UF	\$ 16.119.985.930	46,5%
Saldo por pagar (IVA incl.)	552.388 UF	\$ 16.862.881.685	53,5%
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	479.946 UF	\$ 19.182.783.257	46,5%

Avance físico frente al financiero


Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	43,0%	
Avance ejecutado a la fecha	44,2%	
Desviación física	+1,20 pp	Adelanto de 5,5 días hábiles
Avance financiero acumulado (rendiciones netas)	48,9%	Rendiciones netas sobre monto neto, hasta la rendición N° 17
Brecha avance financiero vs físico	+4,65 pp	Mayor gasto rendido que avance físico certificado
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	46,5%	
Plazo transcurrido	52,8%	Día 547 de 1.035

Estados de pago y rendiciones

En el período se cursó el EEPP 17 por 39.046 UF IVA incluido (factura N° 6929). La rendición N° 18, de septiembre, aún no ha sido presentada.

Estados de pago ordinarios 17 Último emitido: EEPP 17	Anticipos cursados 3 72.133 UF pagados	Estado de pago del período 39.046 UF EEPP 17, factura N° 6929	Rendiciones del período Pendiente Rendición N° 18 aún no presentada
--	---	--	--

Monto por estado de pago y pagado acumulado

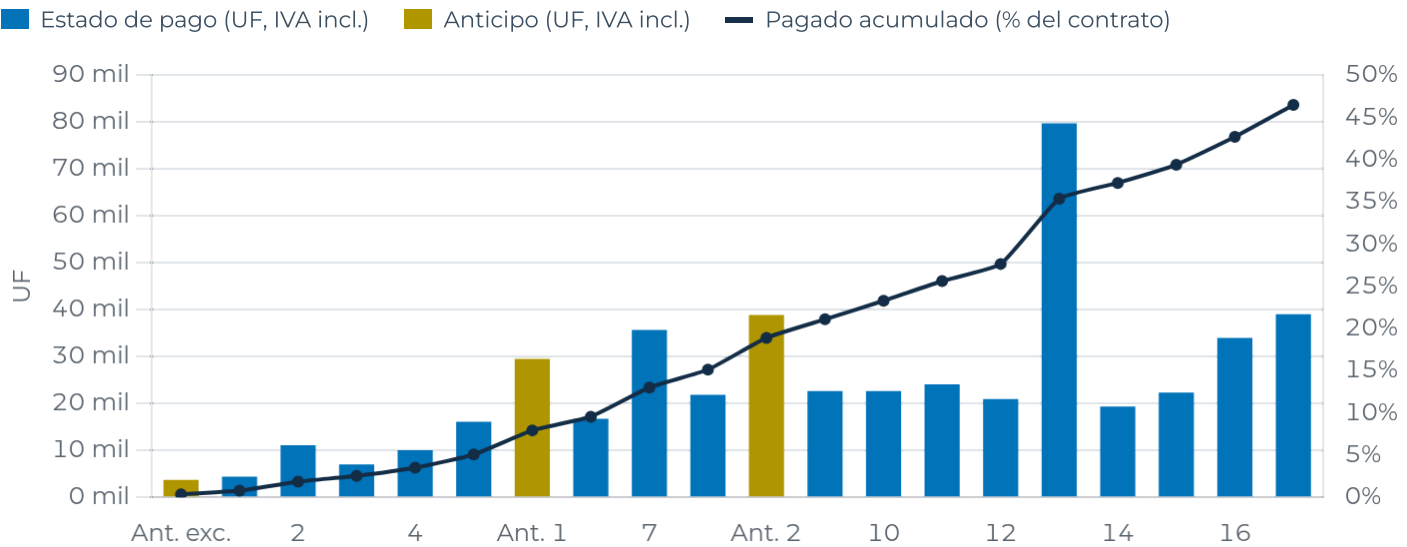

Concepto	UF	Detalle
Total neto facturado	403.316 UF	Estados de pago y anticipos
IVA facturado	76.630 UF	19% sobre el neto
Total pagado (IVA incl.)	479.946 UF	46,5% del contrato
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	\$ 19.182.783.257	48,9% de avance financiero acumulado

Detalle de los 20 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	Valor UF	IVA (UF)	Total (UF)	Acum. % contrato
Anticipo exc.	—	6653	3.099,48	39.042,94	588,90	3.688,38	0,4%
EEPP 1	—	6671	3.685,43	39.075,41	700,23	4.385,66	0,8%
EEPP 2	—	6680	9.335,99	39.189,45	1.773,84	11.109,83	1,9%
EEPP 3	—	6686	5.887,90	39.267,07	1.118,70	7.006,60	2,5%
EEPP 4	—	6705	8.448,72	39.179,01	1.605,26	10.053,98	3,5%
EEPP 5	09-09-2025	6723	13.534,86	39.383,07	2.571,62	16.106,48	5,1%
Anticipo 1	14-10-2025	6721	24.819,14	39.485,65	4.715,64	29.534,78	7,9%
EEPP 6	—	6744	14.056,42	39.485,65	2.670,72	16.727,14	9,6%
EEPP 7	17-11-2025	6756	30.004,17	39.567,67	5.700,79	35.704,96	13,0%
EEPP 8	24-12-2025	6775	18.379,47	39.643,59	3.492,10	21.871,57	15,1%
Anticipo 2	21-01-2026	6764	32.697,05	39.727,96	6.212,44	38.909,49	18,9%
EEPP 9	—	6791	19.040,60	39.727,96	3.617,71	22.658,31	21,1%
EEPP 10	31-01-2026	6810	19.032,76	39.706,07	3.616,22	22.648,98	23,3%
EEPP 11	28-02-2026	6824	20.263,16	39.790,63	3.850,00	24.113,16	25,6%
EEPP 12	30-03-2026	6840	17.592,95	39.841,72	3.342,66	20.935,61	27,7%
EEPP 13	30-04-2026	6857	67.016,30	40.120,20	12.733,10	79.749,40	35,4%
EEPP 14	31-05-2026	6875	16.262,49	40.610,68	3.089,87	19.352,36	37,3%
EEPP 15	30-06-2026	6893	18.770,61	40.820,31	3.566,42	22.337,03	39,4%
EEPP 16	31-07-2026	6910	28.576,51	40.844,79	5.429,54	34.006,05	42,7%
EEPP 17	31-08-2026	6929	32.812,17	40.873,77	6.234,31	39.046,48	46,5%
Total			403.316,18		76.630,07	479.946,25	46,5%

Estructura de costos rendidos

El gasto rendido acumulado equivale al 41,60% del monto del contrato. Los subcontratos concentran el 39,81% del gasto. Corresponde a lo rendido hasta la rendición N° 17; la N° 18 aún no ha sido presentada.


Ítem de costo	Participación en el gasto rendido	% del gasto	% s/ contrato
Subcontratos		39,81%	16,56%
Facturas		21,44%	8,92%
Mano de obra		16,29%	6,78%
Honorarios C.I.H.L.A.		16,19%	6,73%
Arriendos y fletes		4,22%	1,76%
Gastos generales obra		2,01%	0,84%
I.E.C.		0,04%	0,01%
Total gasto rendido		100,00%	41,60%

Requerimientos de información (RDI)

De 69 RDI emitidas, 58 están resueltas (84,1%). Quedan 11 pendientes, 11 de ellas vencidas. Estado al 05-10-2026.

● Amarillo: cierre de RDI

RDI emitidas 69 Estado al 05-10-2026	Resueltas 58 Tasa de cierre 84,1%	Pendientes 11 15,9% del total	Abiertas vencidas 11 De 11 abiertas
Respuesta promedio 23,4 días Entre consulta y respuesta			

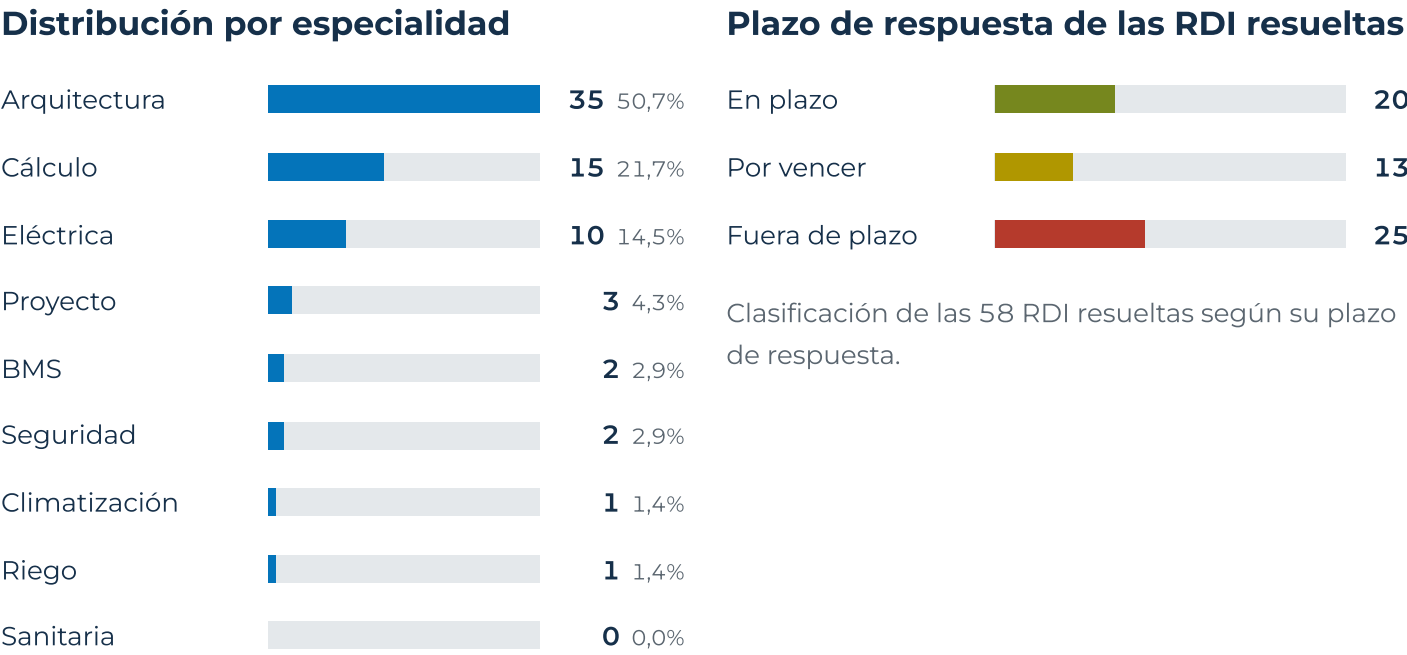

Calidad de obra

Se recibió la estructura hasta losa de cielo piso 7. Hubo dos observaciones, en enfierradura de cabezales y en el foso de ascensor, corregidas sin impacto en plazo.

Revisiones del período

- Se reciben en conjunto al ITE trabajos de enfierradura y hormigonado de estructuras hasta losa de cielo piso 7, incluyendo pasadas en losas y muros para instalaciones.
- Se verifican en terreno instalaciones en losa y muro de obra gruesa.
- Se revisa la correcta ejecución de tabiquería en bodegas y hall de ascensores.

Observaciones

Enfierradura: segunda capa de cabezales


Se detecta una falla en la instalación de enfierradura: no se había instalado la segunda capa de cabezales.

Solución

Se agregan los elementos pendientes.

Impacto

La observación no tiene impacto en plazo, ya que fue detectada a tiempo.



Foso de ascensor: luminarias en muro

Se detecta que faltaban las luminarias en el muro del foso de ascensor antes del cierre de moldaje.

Solución

Se agregan los elementos pendientes.

Impacto

La observación no tiene impacto en plazo, ya que fue detectada a tiempo.



Seguridad e higiene

La accidentabilidad de la obra (8,17%) es 3,0 veces la de la industria (2,72%). Van 4 días sin accidentes al 25-09-2026.

● Rojo: seguridad (accidentabilidad vs industria)


Accidentes acumulados	Días perdidos acumulados	Último accidente	Días sin accidentes
10	167	21-09-2026	4
		7 días perdidos	Al 25-09-2026

Comparación con la industria

Indicador	Torre 1	Industria 2025	Brecha
Tasa de accidentabilidad (ago-26)	8,17%	2,72%	+5,45 pp
Días perdidos por accidente	16,7	24,6	-7,88 días
Tasa de siniestralidad (abr-25 a ago-26)	156,3	No informado	—

Fuente de industria: Industria construcción 2025, base estadística sobre seguridad social 2025. Siniestralidad = días perdidos del período / promedio anual de trabajadores × 100. Accidentabilidad = N° de accidentes del período / promedio anual de trabajadores × 100.

Cumplimiento D.S. N° 594 (servicios higiénicos)



Dotación de referencia: 388 personas por turno (edificios Uno, Tres y Cuatro). Todos los servicios superan el mínimo exigido.

Recursos en obra frente a estados de pago

El inventario en obra es menor que lo pagado en EEPP en los tres recursos controlados. La mayor diferencia es 6,8%, en moldaje de losa.

● Amarillo: conciliación de recursos obra vs EEPP

Recurso	En obra	En EEPP	Diferencia	%
Alzaprimas (un)	4.457	4.616	-159	-3,4%
Moldaje losa (m²)	2.329	2.500	-171	-6,8%
Moldaje muros (m²)	346,9	360	-13,1	-3,6%

La rendición N° 18, de septiembre, aún no ha sido presentada, por lo que el comparativo se mantiene con las cantidades del último estado de pago y se actualizará cuando se presente.

Hitos y hechos relevantes del período

Hitos contractuales

- Avance de obra en losa cielo piso 7.
- La constructora entrega a la inmobiliaria el presupuesto de obra por partidas para seguimiento mensual, que se revisa con la ITO y la inmobiliaria. Se valida el avance asociado a la rendición N° 17.
- Instalación de faenas terminada y entregada al comité paritario de obra. Se instala todo el equipo profesional de Torre 1.

Hechos relevantes

- Con fecha 30-09-2026 se cierra el período con un avance real de 44,22% contra 43,02% programado, con un adelanto de 5,5 días.
- Se evalúa con la inmobiliaria y la constructora eliminar parte de las instalaciones de extracción de clima en piso -1, locales comerciales. La constructora presenta en primera instancia un monto aproximado de 1.000 UF por la disminución. Tema pendiente de definición.
- Se actualiza el proyecto de basuras. Queda pendiente la actualización de arquitectura y del proyecto sanitario.
- Se confirma el inicio de los trabajos de empalme provisorio con carácter de definitivo de Enel.
- Se entrega el mockup de jardineras con la solución integral de impermeabilización.

Registro fotográfico

24 fotografías del período, ordenadas desde el nivel más bajo hacia la cubierta. Seleccione una para ampliarla.



Subterráneo -8
Tabiques



Piso -8
Instalaciones clima



Piso -7
Hall escaleras



Piso -6
Avance remates albañilería




Piso -5
Ascensor parking




Piso -4
Hall escaleras



Piso -3
Barandas metálicas

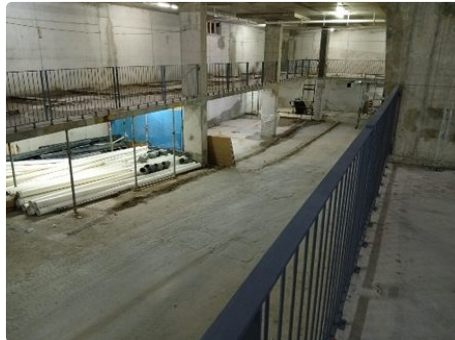

Piso -2
Barandas metálicas

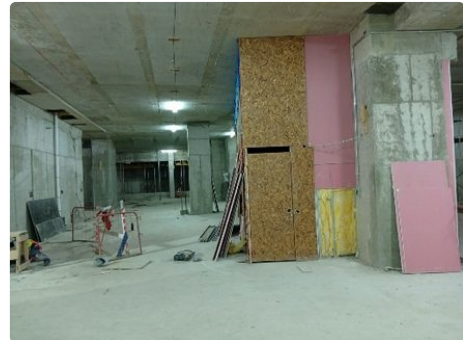

Piso -1
Hall ascensores



Piso -1
Locales comerciales



Piso 1
Hall principal



Piso 1
Vista exterior



Exterior
Vista norte



Exterior
Vista poniente




Exterior
Vista poniente 2



Exterior
Empalme exterior



Piso 2
Planta libre

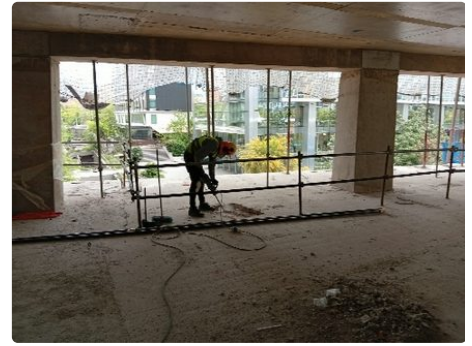

Piso 3
Trabajo cajones Postec



Piso 4
Planta libre alzaprimada



Piso 5
Retiro mesas PERI



Piso 6
Avance escaleras



Piso 6
Avance obra gruesa




Piso 7
Avance obra gruesa



Piso 7
Avance obra gruesa

Accesos y gestión de camiones

La obra opera con 3 frentes de acceso controlados. Sin reclamos de vecinos durante el período.

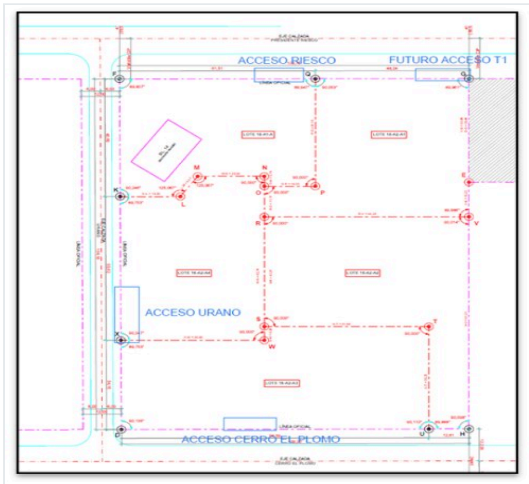

Plano de accesos habilitados.

Acceso	Vehículos	Personal	Control
Pdte. Riesco	Camión tolva y hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	2 accesos. Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería fija y jornal de lavado de ruedas.
Urano	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.
Cerro El Plomo	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.

Fotografías de accesos



Pdte. Riesco
Acceso 1



Urano
Acceso



Cerro El Plomo
Acceso



Pdte. Riesco
Acceso 2



Urano
Acceso



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago

contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 12, revisión 0

Edificio Torre 1, Lote 18 (GIP_308)

Período septiembre 2026, cierre 30-09-2026
