



Informe ejecutivo N° 11, revisión 0

Edificio Torre 1, Lote 18

Agosto 2026

Cierre del período: 31-08-2026

Cliente

Proyecta Gestión

Constructora

CIH

Tipo de contrato

Administración

Código de proyecto

GIP_308

Superficie

41.597,97 m²

Plazo contractual


**01-04-2025 al
31-01-2028**



Vista sur, agosto 2026

Dónde está la obra al cierre de agosto 2026

Con el 50,0% del plazo transcurrido, la obra lleva 40,7% ejecutado: +0,77 pp sobre el programa. El avance financiero (48,9%) supera en 8,19 pp al avance físico.

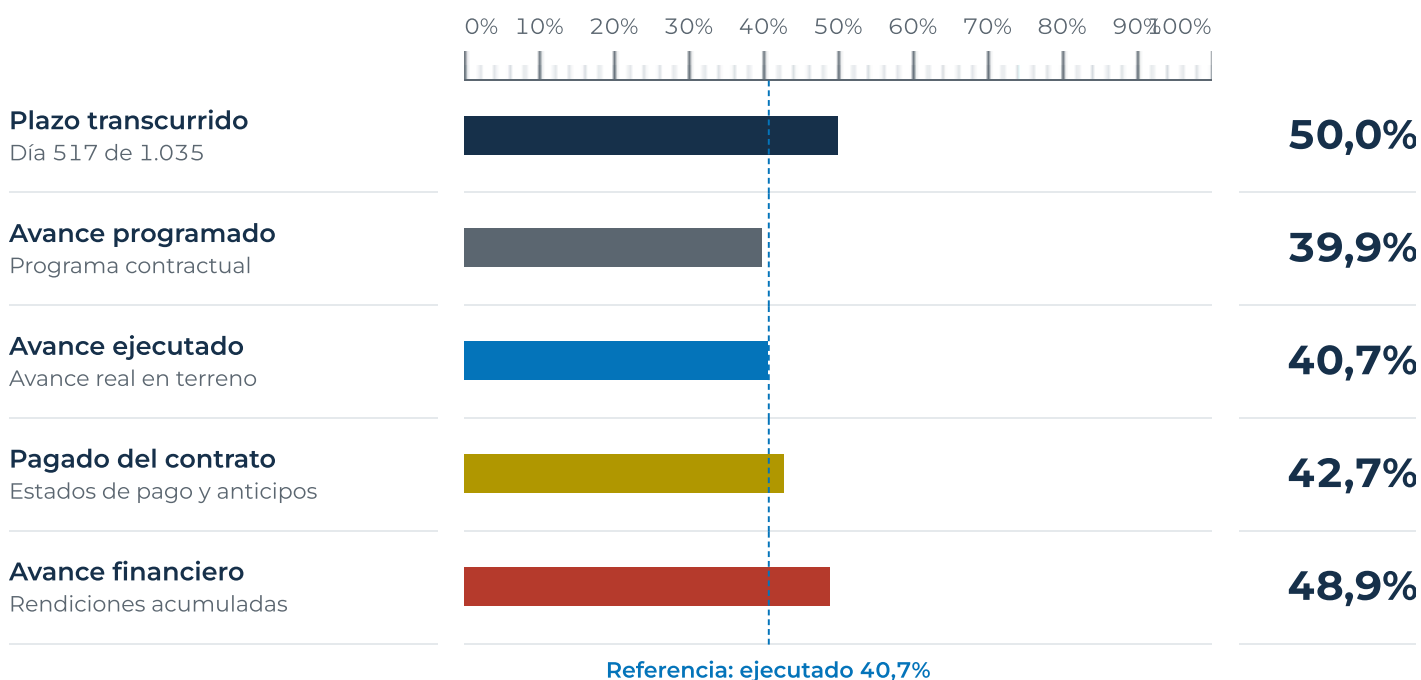

Semáforo de gestión

Verde
Avance físico vs programa
Ejecutado 40,7% vs programado 39,9% (+0,77 pp)
Rojo
Avance financiero vs físico
Gasto rendido 48,9% vs avance físico 40,7% (+8,19 pp)
Amarillo
Cierre de RDI
Tasa de cierre 76,9%, con 15 pendientes y 14 vencidas
Rojo
Seguridad (accidentabilidad vs industria)
Accidentabilidad 7,47% vs 2,72% de la industria (2,7 veces)
Amarillo
Conciliación de recursos obra vs EEPP
Máxima diferencia de 6,8% entre inventario en obra y lo pagado en EEPP

Antecedentes del contrato

Contrato por administración con CIH, por 1.032.334 UF IVA incluido y un plazo de 1.035 días. Restan 518 días para el término.

Constructora	CIH	Fecha de inicio	01-04-2025
Descripción de la obra	Edificio Torre 1, Lote 18	Fecha de término	31-01-2028
Tipo de contrato	Administración	Plazo de ejecución	1.035 días
Tipo de obra	Construcción	Días restantes	518 días
Código	GIP_308	Plazo transcurrido	50,0%
Superficie	41.597,97 m²	Monto del contrato (IVA incl.)	1.032.334 UF

Pólizas de seguro

Aseguradora	N° de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Chubb	6037094	Responsabilidad civil	226,10 UF	01-09-2025 al 29-05-2028
Southbridge	20119458	Todo riesgo de construcción	1.532,37 UF	14-08-2025 al 29-05-2028

Avance físico

Ejecutado 40,68% contra 39,91% programado al 31-08-2026: 5,5 días hábiles de adelanto. Para terminar en plazo se necesitan 3,5 puntos de avance por mes.


● Verde: avance físico vs programa

Programado a la fecha 39,91% Línea base	Ejecutado a la fecha 40,68% Avance real en terreno	Desviación +0,77 pp 5,5 días hábiles de adelanto
--	---	---

Avance mensual


Avance necesario para terminar en plazo
3,5 puntos
Por mes hasta el término (31-01-2028); faltan 59,32%

Seguimiento semanal de avance

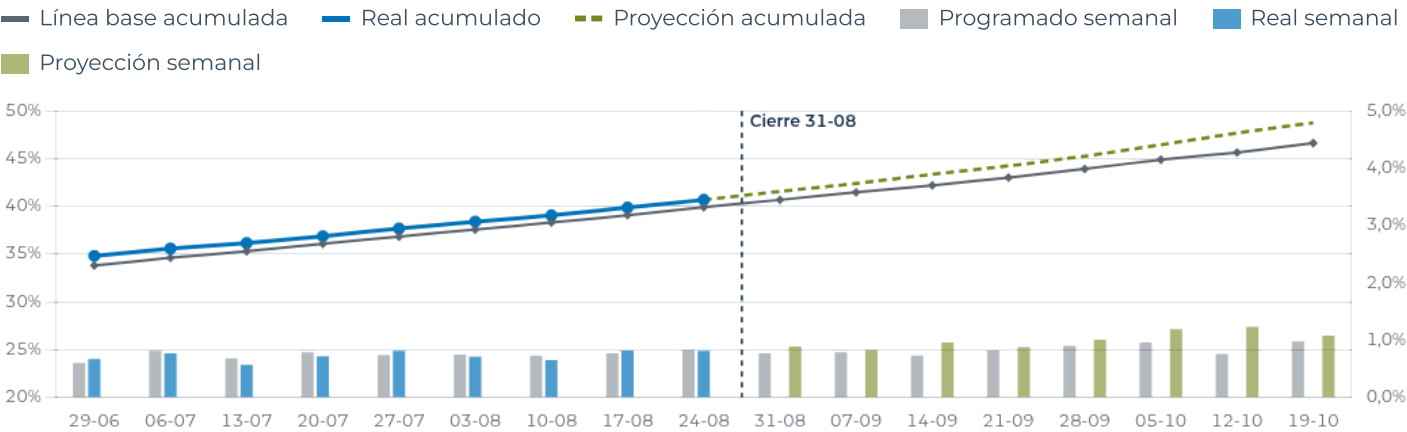


Este desfase de +0,77% respecto de la línea base representa un total aproximado de 5,5 días hábiles de adelanto acumulado. Las barras se leen en el eje derecho (avance semanal) y las líneas en el izquierdo (avance acumulado).

Hitos del programa

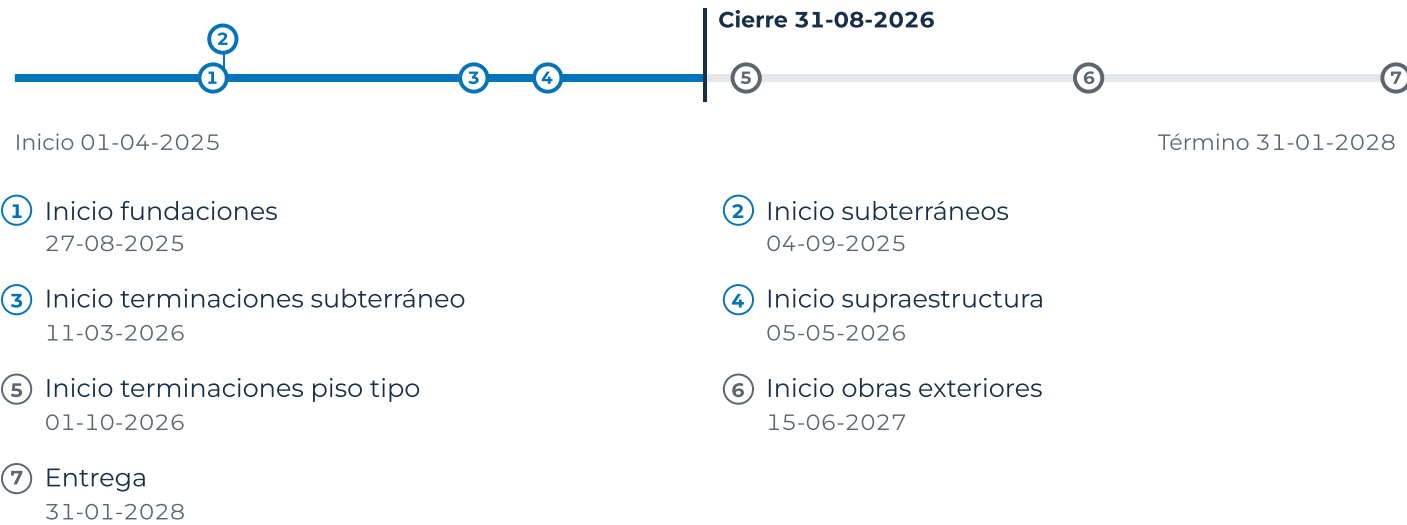

Fechas según línea base del programa. Los hitos en azul tienen fecha programada anterior al cierre del período.

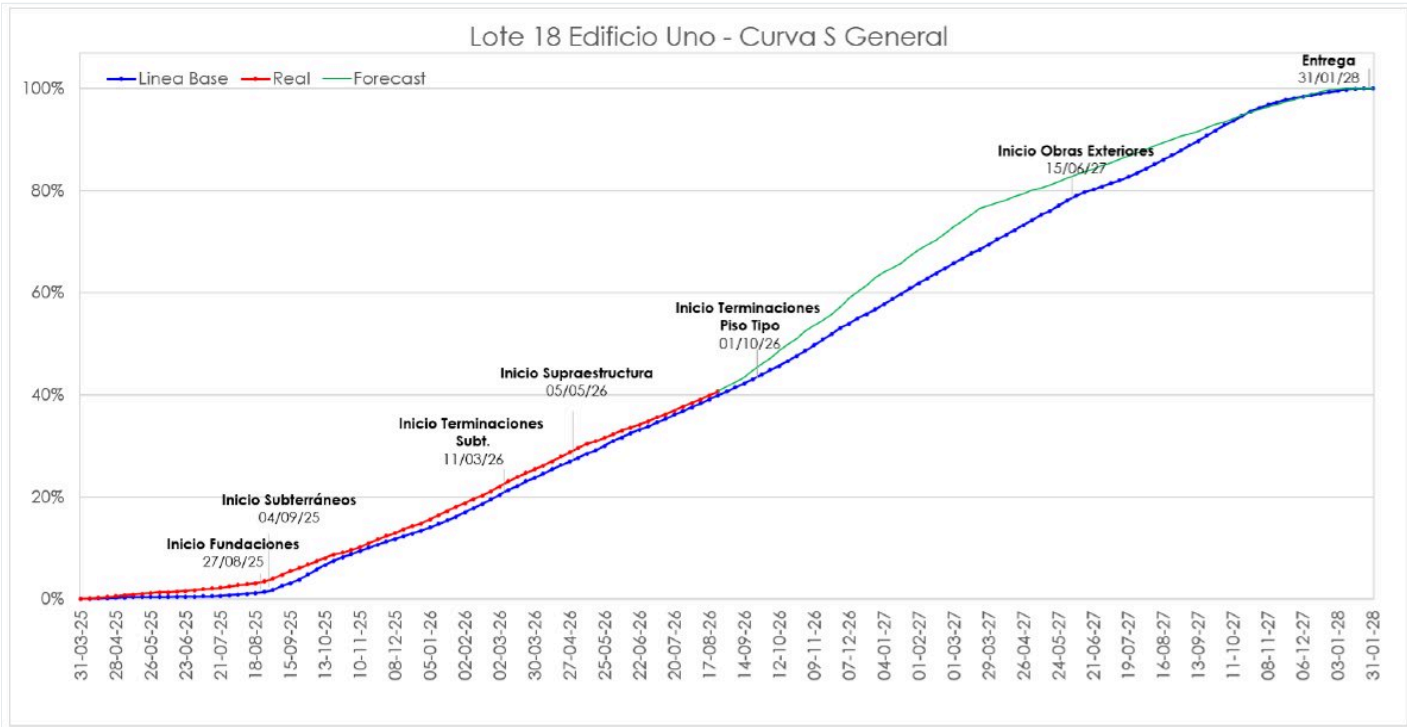

Curva S general del proyecto, con línea base, avance real y proyección hasta la entrega.

Producción semanal en m² (semanas 37 a 53)


Semana	Fecha	m² programado	Acumulado	m² instalados	Acumulado	Desv. parcial	Desv. acum.	Desfase (días)
37	04-05-2026	536	42.483	501	44.223	-34,9	+1.739	14
38	11-05-2026	536	43.020	700	44.922	+163,6	+1.903	13
39	18-05-2026	429	43.448	339	45.261	-89,9	+1.813	9

Semana	Fecha	m ² programado	Acumulado	m ² instalados	Acumulado	Desv. parcial	Desv. acum.	Desfase (días)
40	25-05-2026	953	44.402	496	45.757	-457,5	+1.355	8
41	01-06-2026	965	45.367	636	46.393	-328,6	+1.027	6
42	08-06-2026	738	46.105	845	47.238	+106,8	+1.133	6
43	15-06-2026	1.071	47.175	970	48.208	-100,7	+1.033	5
44	22-06-2026	1.061	48.237	532	48.740	-528,8	+504	3
45	29-06-2026	866	49.103	1.020	49.761	+154,0	+658	4
46	06-07-2026	951	50.054	660	50.421	-291,0	+367	3
47	13-07-2026	761	50.815	627	51.048	-134,5	+232	2
48	20-07-2026	847	51.663	693	51.741	-154,0	+78	1
49	27-07-2026	824	52.487	751	52.492	-73,5	+5	1
50	03-08-2026	846	53.333	1.309	53.801	+462,7	+468	3
51	10-08-2026	1.017	54.350	420	54.221	-597,2	-130	-1
52	17-08-2026	1.017	55.367	1.464	55.685	+446,9	+317	2
53	24-08-2026	930	56.298	1.108	56.793	+177,5	+495	3

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 42,7% del contrato (440.900 UF, incluidos 72.133 UF de anticipos). Quedan 591.435 UF por pagar.

● Rojo: avance financiero vs físico



Anticipos 72.133 UF 7,0% del contrato	Estados de pago 368.767 UF 35,7% del contrato	Saldo por pagar 591.435 UF 57,3% del contrato
--	--	--

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	1.032.334 UF	\$ 39.249.612.462	100,0%
Monto neto del contrato	867.508 UF	\$ 32.982.867.615	84,0%
Costo directo	695.920 UF	—	67,4%
Gastos generales y utilidades	171.588 UF	—	16,6%
Anticipos pagados a la fecha	72.133 UF	—	7,0%
Pagado en estados de pago y anticipos	440.900 UF	\$ 16.119.985.930	42,7%
Saldo por pagar (IVA incl.)	591.435 UF	\$ 16.862.881.685	57,3%
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	472.358 UF	\$ 19.182.783.257	45,8%

Avance físico frente al financiero


Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	39,9%	
Avance ejecutado a la fecha	40,7%	
Desviación física	+0,77 pp	Adelanto de 5,5 días hábiles
Avance financiero acumulado (rendiciones netas)	48,9%	Rendiciones netas sobre monto neto
Brecha avance financiero vs físico	+8,19 pp	Mayor gasto rendido que avance físico certificado
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	42,7%	
Plazo transcurrido	50,0%	Día 517 de 1.035

Estados de pago y rendiciones

En el período se cursó el EEPP 16 por 34.006 UF IVA incluido (factura N° 6910). Las rendiciones del mes suman \$ 1.595.976.853.

Estados de pago ordinarios 16 Último emitido: EEPP 16	Anticipos cursados 3 72.133 UF pagados	Estado de pago del período 34.006 UF EEPP 16, factura N° 6910	Rendiciones del período \$ 1.595.976.85 IVA incluido
--	---	--	---

Monto por estado de pago y pagado acumulado

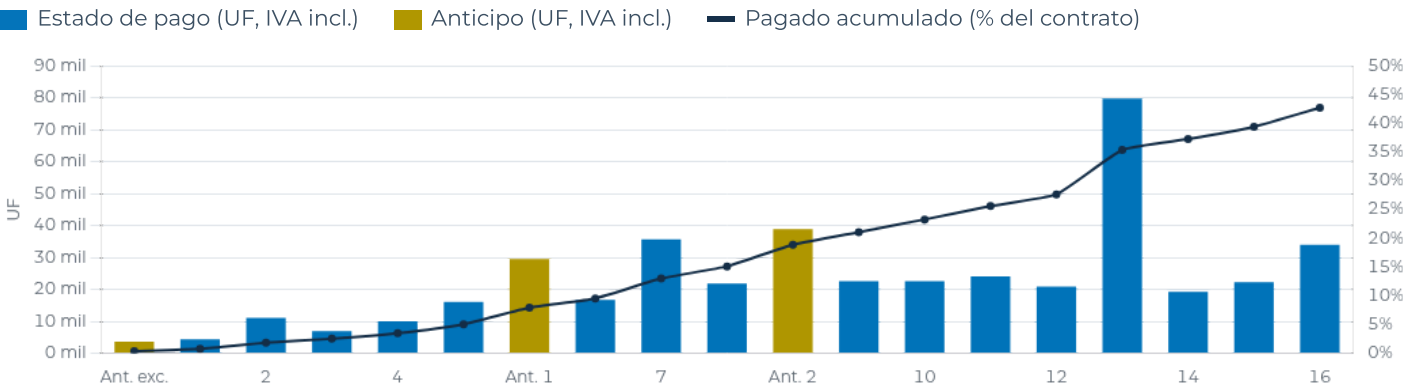

Concepto	UF	Detalle
Total neto facturado	370.504 UF	Estados de pago y anticipos
IVA facturado	70.396 UF	19% sobre el neto
Total pagado (IVA incl.)	440.900 UF	42,7% del contrato
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	\$ 19.182.783.257	48,9% de avance financiero acumulado

Detalle de los 19 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	Valor UF	IVA (UF)	Total (UF)	Acum. % contrato
Anticipo exc.	—	6653	3.099,48	39.042,94	588,90	3.688,38	0,4%
EEPP 1	—	6671	3.685,43	39.075,41	700,23	4.385,66	0,8%
EEPP 2	—	6680	9.335,99	39.189,45	1.773,84	11.109,83	1,9%
EEPP 3	—	6686	5.887,90	39.267,07	1.118,70	7.006,60	2,5%
EEPP 4	—	6705	8.448,72	39.179,01	1.605,26	10.053,98	3,5%
EEPP 5	09-09-2025	6723	13.534,86	39.383,07	2.571,62	16.106,48	5,1%
Anticipo 1	14-10-2025	6721	24.819,14	39.485,65	4.715,64	29.534,78	7,9%
EEPP 6	—	6744	14.056,42	39.485,65	2.670,72	16.727,14	9,6%
EEPP 7	17-11-2025	6756	30.004,17	39.567,67	5.700,79	35.704,96	13,0%
EEPP 8	24-12-2025	6775	18.379,47	39.643,59	3.492,10	21.871,57	15,1%
Anticipo 2	21-01-2026	6764	32.697,05	39.727,96	6.212,44	38.909,49	18,9%
EEPP 9	—	6791	19.040,60	39.727,96	3.617,71	22.658,31	21,1%
EEPP 10	31-01-2026	6810	19.032,76	39.706,07	3.616,22	22.648,98	23,3%

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	Valor UF	IVA (UF)	Total (UF)	Acum. % contrato
EEPP 11	28-02-2026	6824	20.263,16	39.790,63	3.850,00	24.113,16	25,6%
EEPP 12	30-03-2026	6840	17.592,95	39.841,72	3.342,66	20.935,61	27,7%
EEPP 13	30-04-2026	6857	67.016,30	40.120,20	12.733,10	79.749,40	35,4%
EEPP 14	31-05-2026	6875	16.262,49	40.610,68	3.089,87	19.352,36	37,3%
EEPP 15	30-06-2026	6893	18.770,61	40.820,31	3.566,42	22.337,03	39,4%
EEPP 16	31-07-2026	6910	28.576,51	40.844,79	5.429,54	34.006,05	42,7%
Total			370.504,01	70.395,76	440.899,77	42,7%	

Estructura de costos rendidos

El gasto rendido acumulado equivale al 41,60% del monto del contrato. Los subcontratos concentran el 39,81% del gasto.

Ítem de costo	Participación en el gasto rendido	% del gasto	% s/ contrato
Subcontratos		39,81%	16,56%
Facturas		21,44%	8,92%
Mano de obra		16,29%	6,78%
Honorarios C.I.H.L.A.		16,19%	6,73%
Arriendos y fletes		4,22%	1,76%
Gastos generales obra		2,01%	0,84%
I.E.C.		0,04%	0,01%
Total gasto rendido		100,00%	41,60%

Requerimientos de información (RDI)

De 65 RDI emitidas, 50 están resueltas (76,9%). Quedan 15 pendientes, 14 de ellas vencidas. Estado al 14-09-2026.

RDI emitidas 65 Estado al 14-09-2026	Resueltas 50 Tasa de cierre 76,9%	Pendientes 15 23,1% del total	Abiertas vencidas 14 De 15 abiertas
Respuesta promedio 22,3 días Entre consulta y respuesta			

Distribución por especialidad		Plazo de respuesta de las RDI resueltas	
Arquitectura	31 47,7%	En plazo	20
Cálculo	15 23,1%	Por vencer	11
Eléctrica	10 15,4%	Fuera de plazo	19
Proyecto	3 4,6%	Clasificación de las 50 RDI resueltas según su plazo de respuesta.	
BMS	2 3,1%		
Seguridad	2 3,1%		
Climatización	1 1,5%		
Riego	1 1,5%		
Sanitaria	0 0,0%		

Calidad de obra

Se recibió la estructura hasta losa de cielo piso 6. Hubo una observación crítica en enfierradura, corregida sin impacto en plazo.

Revisiones del período

- Se reciben en conjunto al ITE trabajos de enfierradura y hormigonado de estructuras hasta losa de cielo piso 6, incluyendo pasadas en losas y muros para instalaciones.
- Se verifican en terreno instalaciones en losa y muro de obra gruesa.
- Se revisa correcta ejecución de tabiquería en bodegas y hall de ascensores.

Observaciones

Observación crítica del período

Se detecta falla en instalación de enfierradura, donde los empalmes de fierro no quedaban amarrados, perdiendo el contacto y en consecuencia el empalme.

Solución

Se juntan y amarran los elementos mal instalados para cumplir los requerimientos de estructura.

Impacto

La observación no tiene impacto en plazo, ya que fue detectada a tiempo.



Pruebas de presión

Se reciben pruebas de presión en alimentación de agua en jardineras de pisos tipo.



Seguridad e higiene

La accidentabilidad de la obra (7,47%) es 2,7 veces la de la industria (2,72%). Van 33 días sin accidentes al 28-08-2026.

● Rojo: seguridad (accidentabilidad vs industria)


Accidentes acumulados	Días perdidos acumulados	Último accidente	Días sin accidentes
8	153	14-07-2026 8 días perdidos	33 Al 28-08-2026

Comparación con la industria

Indicador	Torre 1	Industria 2025	Brecha
Tasa de accidentabilidad (jun-26)	7,47%	2,72%	+4,75 pp
Días perdidos por accidente	19,1	24,6	-5,45 días
Tasa de siniestralidad (abr-25 a jun-26)	154,8	No informado	—

Fuente de industria: Industria construcción 2025, base estadística sobre seguridad social 2025. Siniestralidad = días perdidos del período / promedio anual de trabajadores × 100. Accidentabilidad = N° de accidentes del período / promedio anual de trabajadores × 100.

Cumplimiento D.S. N° 594 (servicios higiénicos)



Dotación de referencia: 301 a 310 personas por turno. Todos los servicios superan el mínimo exigido.

Recursos en obra frente a estados de pago

El inventario en obra es menor que lo pagado en EEPP en los tres recursos controlados. La mayor diferencia es 6,8%, en moldaje de losa.

● Amarillo: conciliación de recursos obra vs EEPP

Recurso	En obra	En EEPP	Diferencia	%
Alzaprimas (un)	4.457	4.616	-159	-3,4%
Moldaje losa (m²)	2.329	2.500	-171	-6,8%
Moldaje muros (m²)	346,9	360	-13,1	-3,6%



Alzaprimas. Piso 1 cuenta con 50% de alzaprimas, piso 2 con 50% del área alzaprimada, piso 3 con 100% y piso 4 con 100% (moldaje cielo piso 5). Se programa el retiro de alzaprimas del paso de camiones para la primera semana de septiembre.



Moldajes. Avance en losa cielo piso 5 con moldaje. Descimbre de cielo piso 3 y 4.

Hitos y hechos relevantes del período

Hitos contractuales

- Avance de obra en losa cielo piso 6.
- La constructora entrega a la inmobiliaria el presupuesto de obra por partidas para seguimiento mensual. Se define una reunión mensual para verificar avances, y la ITO debe validar los avances en terreno.
- Instalación de faenas terminada y entregada al comité paritario de obra. Se instala todo el equipo profesional de Torre 1.

Hechos relevantes

- Con fecha 31-08-2026 se cierra el período con un avance real de 40,68% contra 39,91% programado, con un adelanto de 5,5 días.
- Se define con la inmobiliaria el alcance de tabiquería y la cantidad de baños en piso -1, según lo indicado en reunión de obra.
- Comienza la instalación de moldaje de losa con mesas prefabricadas PERI. Se estima que desde el piso 5 en adelante mejore el rendimiento de instalación de moldaje.
- Planos Tecma entregados con observaciones en piso -1, locales 9 y 10. Se debe considerar cierre de cortina metálica con puerta en local 9.
- Se define en reunión con la constructora que, por el momento, solo se dará orden de compra a los aluminios de cierres vidriados de locales.
- Se fija para septiembre la fecha del mockup de jardineras, para revisar solución técnica y estándar.

Registro fotográfico

22 fotografías del período, ordenadas desde el nivel más bajo hacia la cubierta. Seleccione una para ampliarla.



Subterráneo -8
Trabajo ascensor parking



Piso -8
Instalaciones sanitarias



Piso -7
Ascensor parking



Piso -6
Ascensor parking y tabiquería



Piso -5
Tabiquería bodegas



Piso -4
Hall escaleras



Piso -3
Instalación de faenas



Piso -2
Instalaciones escotillas estanques



Piso -1
Hall ascensores



Piso -1
Locales comerciales



Piso 1
Hall principal



Piso 1
Vista exterior



Exterior
Vista norte



Exterior
Vista poniente



Exterior
Vista poniente 2



Exterior
Vista sur



Piso 2
Planta libre



Piso 3
Jardineras




Piso 4
Avance de escaleras prefabricadas



Piso 5
Mesas de moldaje PERI



Piso 6
Avance obra gruesa

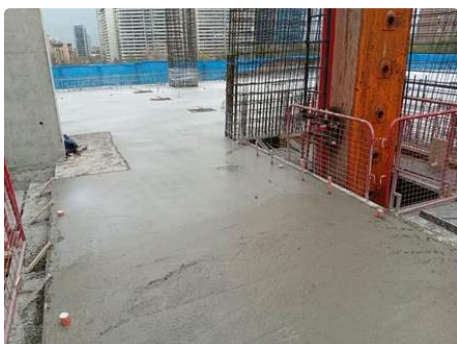


Piso 6
Avance obra gruesa

Accesos y gestión de camiones

La obra opera con 3 frentes de acceso controlados. Sin reclamos de vecinos

durante el período.

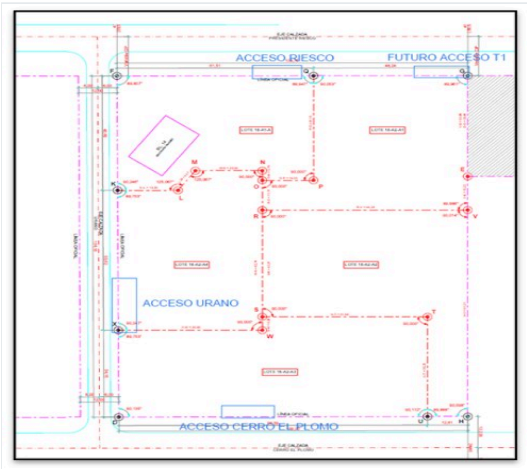


Plano de accesos habilitados.

Acceso	Vehículos	Personal	Control
Pdte. Riesco	Camión tolva y hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	2 accesos. Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería fija y jornal de lavado de ruedas.
Urano	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.
Cerro El Plomo	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.

Fotografías de accesos



Pdte. Riesco
Acceso 1

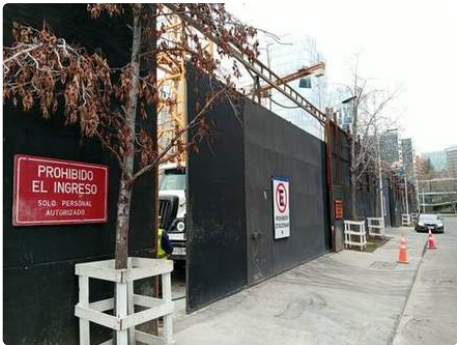

Urano
Acceso



Cerro El Plomo
Acceso



Pdte. Riesco
Acceso 2



Urano
Acceso



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras
Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago
contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 11, revisión 0
Edificio Torre 1, Lote 18 (GIP_308)

